

28. febrúar 2022



Eftirfylgni átaksins Innviðir2020

Eftirfylgni 3 - Lokauppgjör

Kynning í febrúar 2023

Stjórnarráð Íslands
Forsætisráðuneytið

Uppbygging innviða

Staða aðgerða 2022/2023

- Í kjölfar óveðursins í desember 2019 var stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til að vinna tillögur til úrbóta á innviðum
- Í lok febrúar 2020 voru gefnar út lýsingar á aðgerðum
- Í lok árána 2020, 2021 og 2022 var framvinda og staða aðgerða könnuð
- Nokkrar aðgerðir færðust milli ráðuneyta
- Eftirfylgni átaksins er lokið, sem og sérstökum fjárfestingaaðgerðum
- Eftirleiðis eru aðgerðir í eftirfylgni ráðuneyta



Uppbygging innviða

Staða aðgerða 2022/2023

Alls 554 aðgerðir

Opinberar áætlanir 267 aðgerðir (ekki fylgt eftir í þessu verkefni)

Sérstök uppbygging 287 aðgerðir (fylgt eftir í þessu verkefni)

Aðgerðir í sérstakri uppbyggingu eru:

Bein afleiðing óveðursins – rauðar

Flýting vegna óveðursins – gular

Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular

Aðgerðir í sérstakri uppbyggingu skiptast í

Skammtímaaðgerðir – skyldi lokið árið 2020

Langtímaaðgerðir – skyldi lokið árið 2021 eða síðar

Sérstakt fjárfestingaáttak vegna uppbyggingar
COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu
aðgerða til seinkunar

	Fjöldi aðgerða	Hlutfall aðgerða
Allar aðgerðir	554	100%
Opinberar áætlanir	267	48%
Sérstök uppbygging, flokkun aðgerða	287	51%
Rauðar aðgerðir, bein afleiðing óveðursins	207	37%
Gular aðgerðir, flýting vegna óveðursins	40	7%
Appelsínugular aðgerðir, uppbygging innviða óháð óveðrinu	40	7%
Aðgerðir í sérstöku fjárfestingaráttaki ríkisstjórnarinnar	64	22%
Aðgerðir sem hafa tafist eða frestast vegna áhrifa Covid-19	106	37%
Skammtímaaðgerðir (lokið árið 2020)	79	
Ekki hafin eða í bið	0	0%
<50%	14	18%
51-99%	11	14%
Lokið	53	67%
Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir	1	1%
Langtímaaðgerðir	207	
Ekki hafin eða í bið	11	5%
<50%	104	50%
51-99%	48	23%
Lokið	34	16%
Felldar niður - falla undir aðrar aðgerðir	10	5%



Framgangur aðgerða

Skammtímaaðgerðir

- Tæplega 70% lokið (53)
- Uppbyggingaraðgerðum í fjarskiptakerfum að fullu lokið, styrking stoðveitu rúmlega 149 fjarskiptastaða (22)
- Uppbyggingaraðgerðum til styrkingar færanlegs varaafls í orkukerfinu lokið (2)
- Flýtiaðgerðum í dreifikerfinu RARIK vegna óveðursins lokið (10), aðrar flýtiaðgerðir á áætlun (6), 74% af dreifikerfinu komið í jörð
- Flýtiaðgerðum viðgerða og afgreiðslu mála í raforkuflutningskerfinu lokið (2), aðrar flýtiaðgerðir á áætlun (9)
- Viðgerðum vegna tjóns á hafnarmannvirkjum í fárviðrinu lokið (5)

Langtímaaðgerðir

- 95% aðgerða hafnar (186)
- 40% vel á veg komnar eða lokið (82)
- Verið er að vinna upp töf rúmlega 35% aðgerða sem töfðust vegna heimsfaraldurs, en eru komnar af stað, þar á meðal 72 aðgerðir upplýsingaöflunar vegna varaafls innviða
- Fáeinar aðgerðir í bið vegna breytinga á lögum um félagsþjónustu (11)


Framhaldið

- Öllum aðgerðum sem ekki er lokið nú, er fylgt eftir af viðkomandi ráðuneyti



Framvinda innviðir

Skammtímaaðgerðir: Hefjast og lýkur 2020

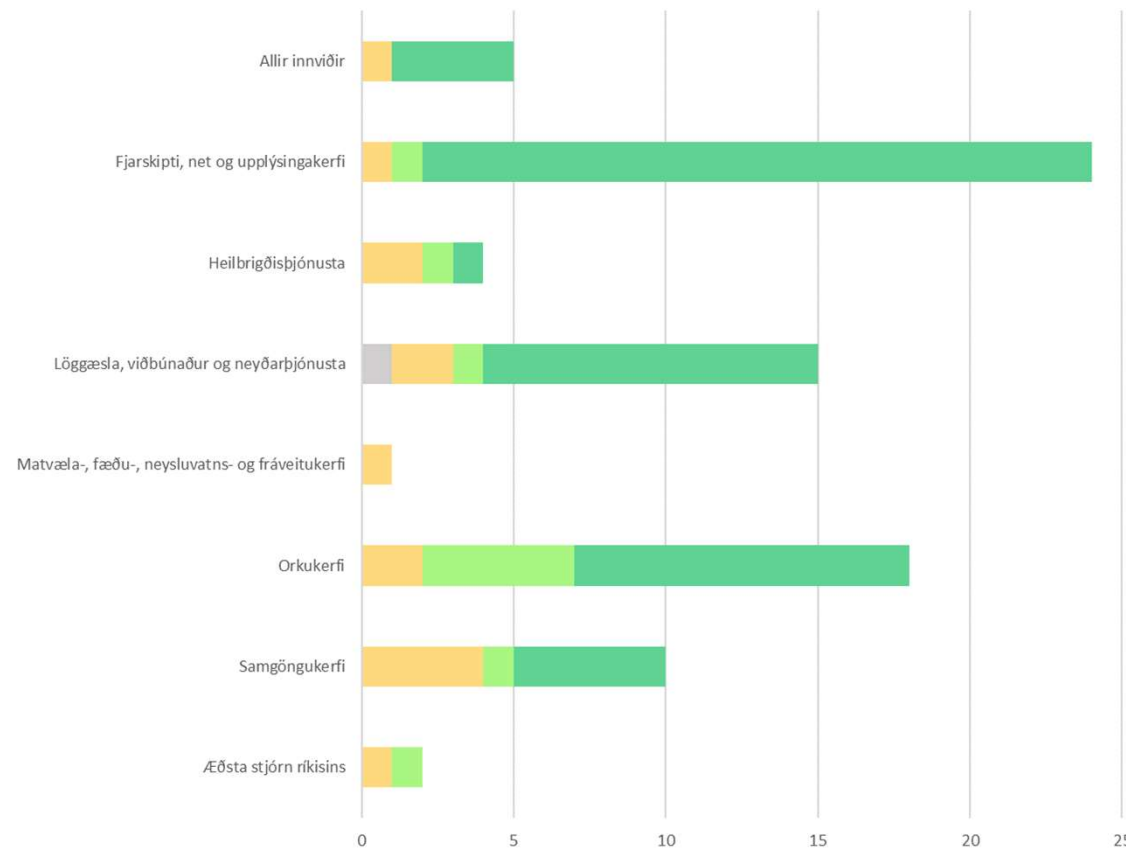

<50%: 9 af 14 aðgerðum eru varaaflsaðgerðir sem töfðust vegna Covid19


50-99%: 11 aðgerðir í farvegi

- Sameinuð annarri aðgerð eða felld niður
- <50%
- 51-99%
- Lokið



Framvinda – innviðir

Langtímaaðgerðir: Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

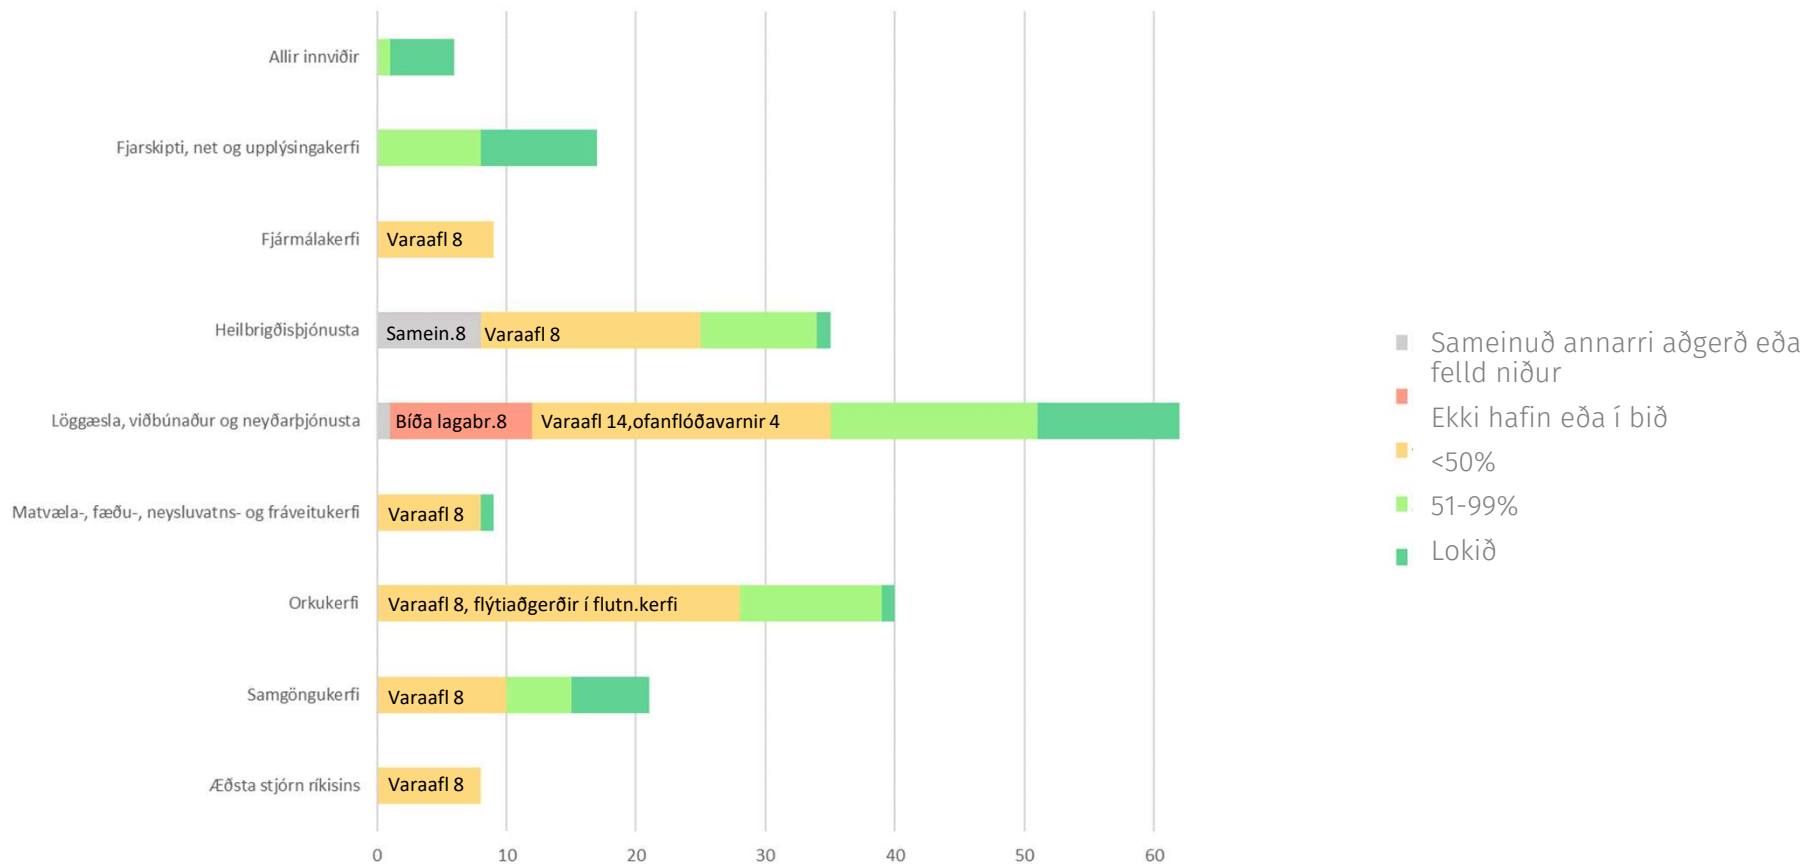



10 vörður – staða

Skammtímaaðgerðir / Langtímaaðgerðir

Í upphafi verkefnisins var aðgerðunum skipt upp í megin áhersluflokka sem kallaðir voru vörður.

Þessar vörður voru:

- **Orka:** Styrking flutnings- og dreifikerfis raforku, einföldun leyfisveitingaferla, raforkutengingar fjarskiptastaða og orkuöryggi á SV horninu (37 aðgerðir)
- **Fjarskipti:** Öryggi í fjarskiptakerfinu (40 aðgerðir)
- **Samgöngur:** Öryggi í samgöngum (22 aðgerðir)
- **Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta:** Almannavarnir, vöktun náttúruvár og ofanflóðavarnir (75 aðgerðir)
- **Allir innviðir:** Varaafl allra innviða, samræmd stefnumótun og hlutverk stofnana (113)



10 vörður - skammtímaaðgerðir

Skammtímaaðgerðir: Hefjast og lýkur 2020

Orka

1. Flýting á lagningu dreifikerfis í jörð 2025 í stað 2030

2. Einföldun og aukin skilvirkni í leyfisveitingaferlum vegna framkvæmda við flutningskerfi raforku

Fjarskipti

5. Grunnnet fjarskipta verði byggt upp með hliðsjón af aðgengi og öryggi og tengingu Íslands við umheiminn

Samgöngur

6. Öryggi verði haft í fyrirrúmi við allar ákvarðanir í samgöngumálum


Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta

7. Efling almannavarnakerfisins og heildstæð vöktun náttúruvár

Allir innviðir

9. Varaafl fyrir alla innviði endurskilgreint og eflt

10. Samræmd stefnumótun í málefnum innviða og áætlunum ríkisins og gætt að hlutverki og yfirsýn stofnana

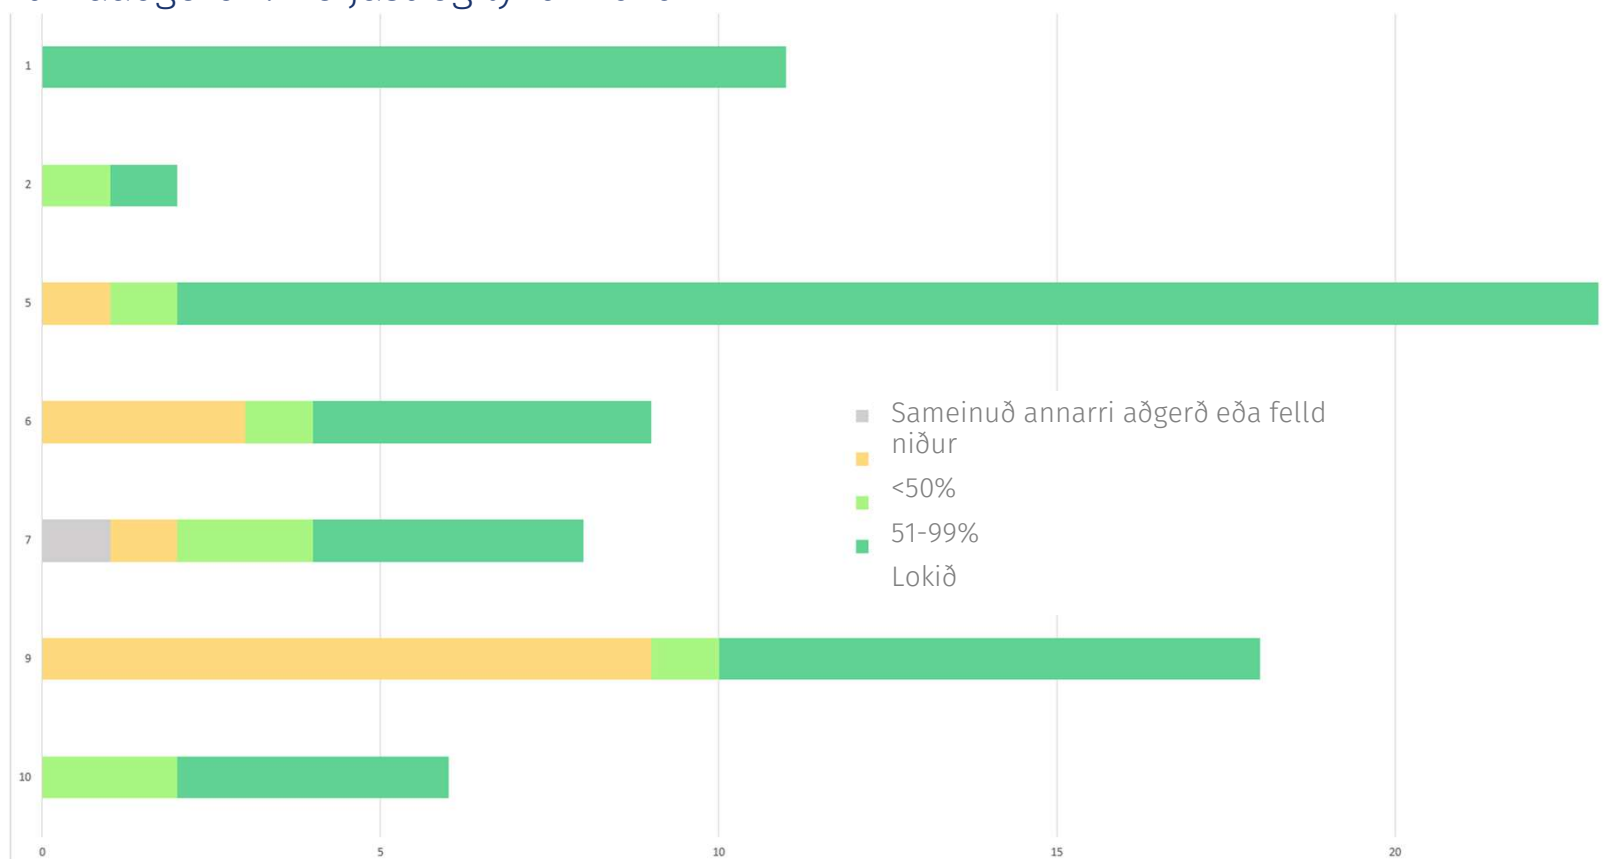



10 vörður - langtímaaðgerðir

Langtímaaðgerðir: Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

Orka

1. Flýting á lagningu dreifikerfis í jörð 2025 í stað 2030
2. Einföldun og aukin skilvirkni í leyfisveitingaferlum vegna framkvæmda við flutningskerfi raforku
3. Framkvæmdir í flutningskerfinu og flýting styrkingar svæðisflutningskerfis raforku
4. Öryggi í framboði varma á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu í nafni almannahagsmuna

Fjarskipti

5. Grunnnet fjarskipta verði byggt upp með hliðsjón af aðgengi og öryggi og tengingu Íslands við umheiminn

Samgöngur


6. Öryggi verði haft í fyrirrúmi við allar ákvarðanir í samgöngumálum

Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta

7. Efling almannavarnakerfisins og heildstæð vöktun náttúruvár
8. Uppbygging ofanflóðavarna verði lokið 2030

Allir innviðir

9. Varaafl fyrir alla innviði endurskilgreint og eft
10. Samræmd stefnumótun í málefnum innviða og áætlunum ríkisins og gætt að hlutverki og yfirsýn stofnana

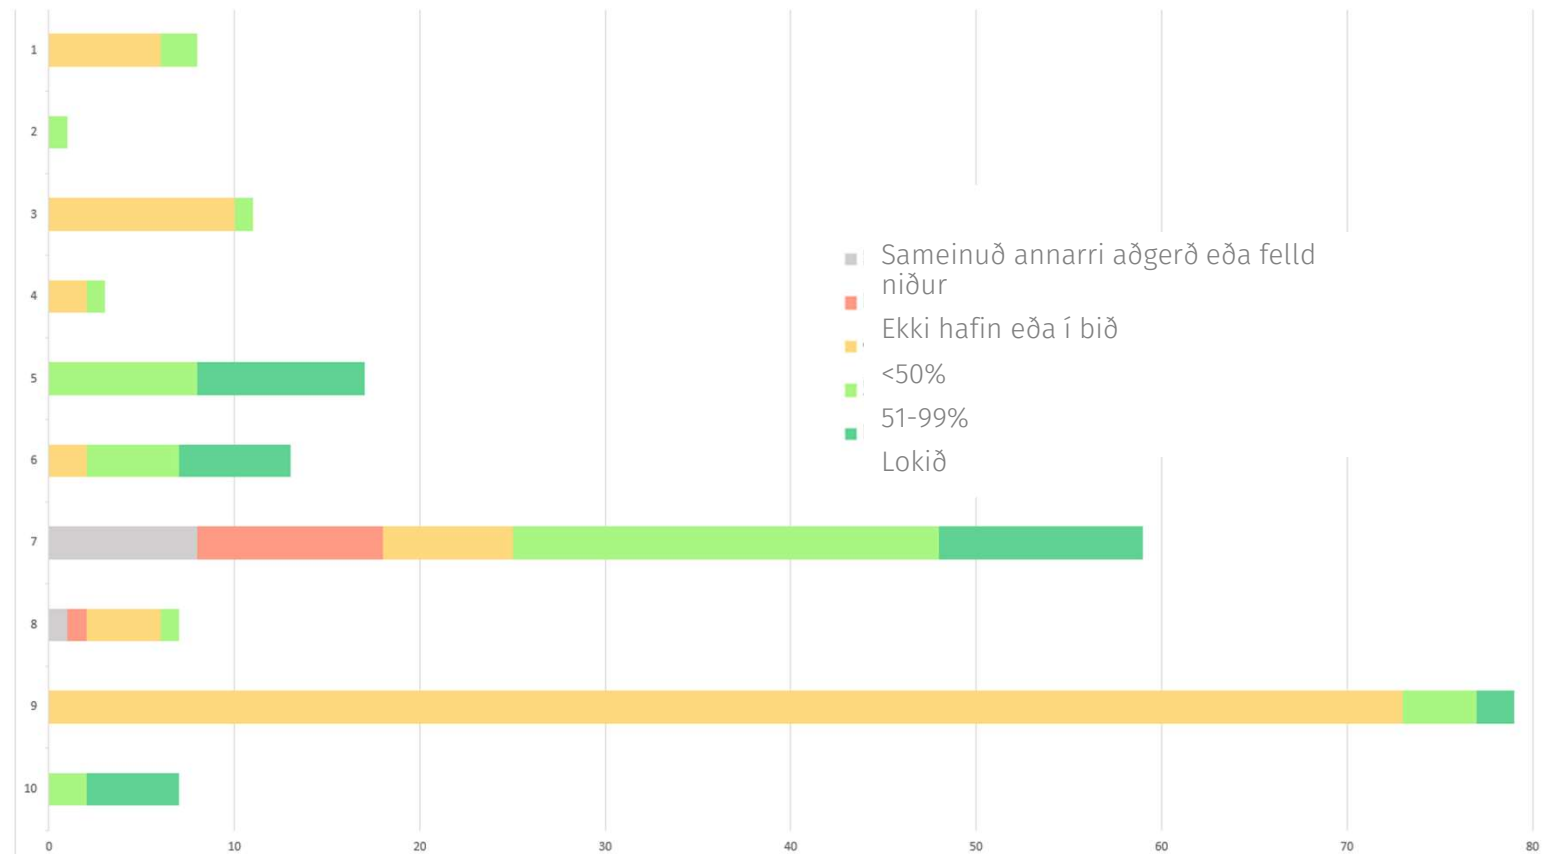



Lokastaða átaksins Innviðir2020

- Viðgerðum vegna tjóns á innviðum í óveðrinu lokið
- Sérstakri styrkingu stoðveitu fjarskiptakerfisins lokið
- Flýtiaðgerðum í raforkudreifikerfi lokið
- Sérstökum fjárfestingaaðgerðum lokið
- Aðgerðir til uppbyggingar raforkuflutnings og dreifikerfis á áætlun
- Hvatt er til að lokið verði upplýsingaöflun, mati á stöðu og uppbyggingu varaafis innviða (72 aðgerðir) – sérstakt eyðublað frá Orkustofnun fylgir gögnum
- Aðgerðir átaksins sem ólokið er eru færðar í áætlanir ráðuneyta
